No.		市町村	おいらせ町

汚水処理整備区域図　　アクションプラン

■目標年次	令和8年度

■手法毎の汚水処理整備区域

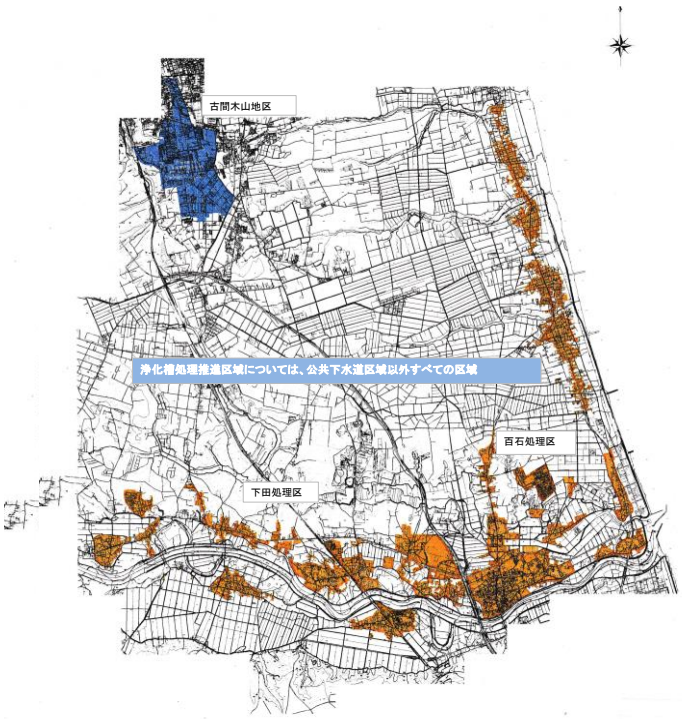

既整備区域	アクションプラン	計画区域	事業種別
赤	赤	赤	公共下水道事業
橙	橙	橙	流域関連公共下水道事業
スミレ	スミレ	スミレ	特定環境保全公共下水道事業
青	青	青	農業集落排水事業
黄緑	黄緑	黄緑	小規模集合排水処理施設整備事業
紫	紫	紫	漁業集落排水事業
	T		処理場
実行メニュー（早期概成）	→	----→	施設の統廃合（実績（実線）／計画（破線））
	カンジ		区域削除
	水色		浄化槽処理促進区域

■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1 平成27年	2 平成28年	3 平成29年	4 平成30年	5 令和元年	6 令和2年	7 令和3年	8 令和4年	9 令和5年	10 令和6年	11 令和7年	12 令和8年	備考
施設整備	下水道	未整備地域の整備終了													
	農業集落排水	古間木山地区の整備終了													
	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業													
		浄化槽設置整備事業													
実行メニュー（早期概成）	共通	時間短縮手法による整備の実施													
	下水道・集落排水	区域の統廃合検討													
	浄化槽	循環型社会形成推進交付金の活用 浄化槽処理促進区域の指定													

②目標値及び概算事業費等

		全体	公共下水道	集落排水施設・コミプラ	浄化槽 個人設置型	浄化槽 市町村設置型	その他（未普及・汲み取り）	備考（早期概成手法の内容）
現況値（R3年度末）	計画区域内人口（人）①	25,230	14,793	3,430	7,007			
	整備人口（人）②	23,236	14,793	3,430	5,013		1,994	
	整備面積（集合処理分）(ha) ③	798	615	183				
	汚水処理人口普及率(%) ④＝②÷①	92.1%	100.0%	100.0%	71.5%			
目標値（R8年度末）	計画区域内人口（人）⑤	23,439	13,276	3,250	6,913			
	整備人口（人）⑥	22,839	13,276	3,250	6,313		600	
	整備面積（集合処理分）(ha) ⑦	798	615	183				
	汚水処理人口普及率(%) ⑧＝⑥÷⑤	97.4%	100.0%	100.0%	91.3%			
日最大汚水量（m3/日）			4,723	1,073				
計画汚泥量（t-DS/日）		429.0	0.0	429.0				
概算事業費	管渠・ポンプ場（百万円）	17,339	15,403	1,936				
	処理場（百万円）	1,089	0	869	220			
	計（百万円）	18,428	15,403	2,805	220			
	年間維持管理費（百万円/年）	252	212	40	0			
整備人口1人当たりの建設費用（千円/人）		807	1,160	863	35		0	
実施メニュー	施設の統廃合	○		古間木山地区→三沢公共下水処理区				
	区域縮小	－						
	浄化槽処理促進区域の指定	○			公共下水道区域外の地区			令和3年度に区域指定
	その他（　　）	－						
